

Revidiertes Informationsblatt über die Rückbauphase

der Anlage TRPP Birr

Stand Anfang August 2026


Die Abbrucharbeiten der TRPP-Anlage verlaufen planmäßig und entsprechend dem Abbruchzeitplan. Der Gesamtfortschritt der Abbrucharbeiten ist nachstehend nach Zonen aufgeschlüsselt dargestellt.

- in Zone 1, Wasseraufbereitungsanlage, wurden die Beton-Fundamenten via Presslufthammer zerkleinert und entfernt. Diese Arbeiten sind gemäß Projektterminplan in dieser Zone bis Mitte August abgeschlossen.
- in Zone 2, Gas-Turbinen-Generatoren Einheiten, ist der Rückbau der mechanischen und elektrischen Anlagen abgeschlossen. Die insgesamt 8 Gasturbinen Einheiten wurden von dieser Zone entfernt und abtransportiert.
- Temporäre Verkehrsregelungen im Bereich der Zonen 1 & 2 (Lärmschutzwand)
 - Die vorübergehende Verkehrsumleitung (Straßen-Verengung) im Zonenbereich 1&2 entlang der Schallschutzwand, wurde in der Kalenderwoche **31 / 2026** eingerichtet und wird bis zum vollständigen Abbau der Lärmschutzwand bestehen bleiben. Gemäß dem Projektzeitplan sollen diese Abbauarbeiten in der Kalenderwoche 45 / 2026 abgeschlossen sein.
 - Der Abbau der Lärmschutzwandabschnitte (Betonplatten und Stahlträger) ist zu 50 % abgeschlossen. Gemäß dem vorgesehenen Zeitplan wird der vollständige Abbau der Lärmschutzwandelemente in der 34. Kalenderwoche / 2026 abgeschlossen sein.
- in Zone 3
 - im Transformatorenbereich ist der Rückbau der mechanischen und elektrischen Neben-Anlagen abgeschlossen. Die Transformatoren werden laut Terminplan in der KW 37 / 2026 abtransportiert werden.
 - Swissgrid Unterwerk Lupfig, ist der Rückbau der mechanischen und elektrischen Anlagen im Gange.
- in Zone 4
 - ist der Rückbau der Treibstofftanks und der dazugehörigen Rohranlagen in Gange und wird bis Ende August abgeschlossen sein.
 - Die Betonwände der Tankanlage wurden teilweise abgebrochen, um den Zugang zu den Reservoirs zu ermöglichen.

Die Projektleitung der TRPP Birr Anlage steht ihnen für Fragen zu diesen Rückbau-Aktivitäten zur Verfügung und kann wie folgt kontaktiert werden:

GE Vernova, Projektleitung
Zentralstrasse 40
5242 Birr
René Schertenleib
Tel. [058 505 71 12](tel:0585057112)

Lageplan Zonen 1 – 4 der Rückbauaktivitäten der TRPP Birr Anlage

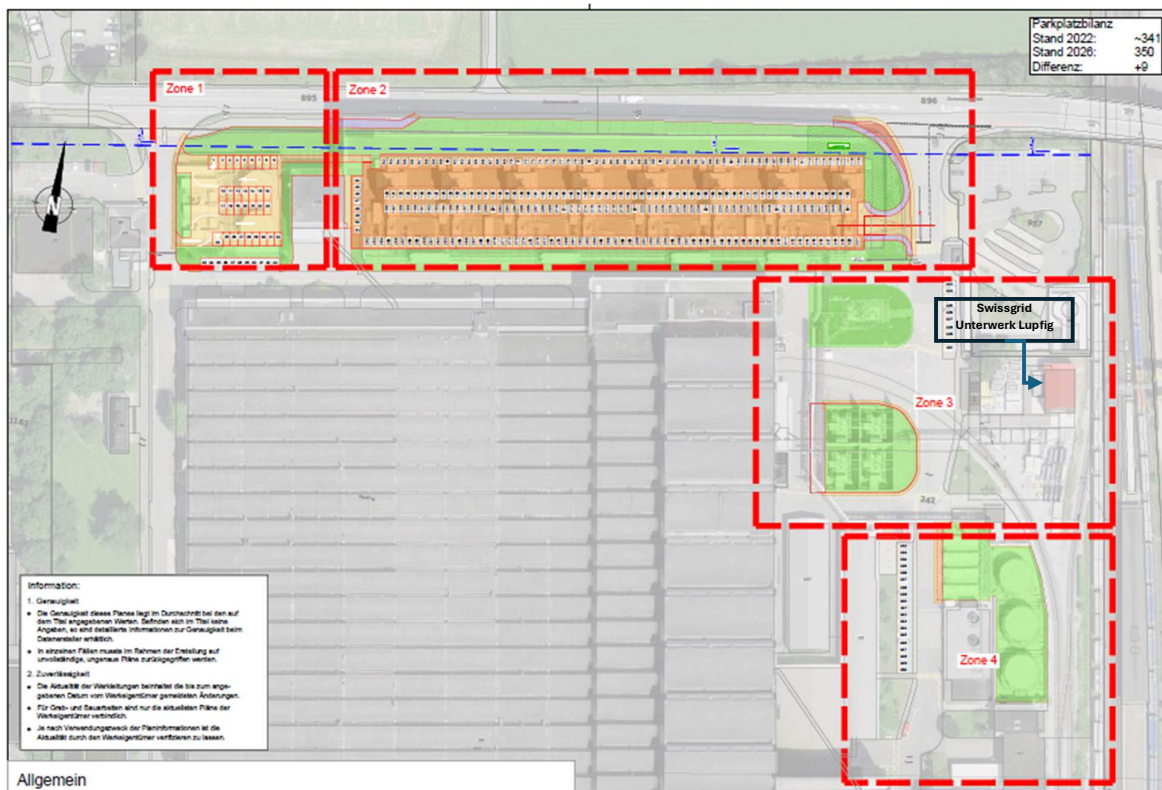

Zone 1 Stand des Rückbaus

Planung der Rückbauaktivitäten der Wasseraufbereitungsanlage

Mai 26	Mai 26	Mai /Juni 26	Aug. 26	Sep. 26	Okt. 26	Nov. 26
Außerbetriebnahme	Demontage der Module	Rückbau der Tankanlage	Rückbau der Fundamente	Parkplatzbau	Parkplatzbau	Begrünung
Abgeschlossen	Abgeschlossen	Abgeschlossen	Abgeschlossen			

Zone 2 Stand des Rückbaus

Planung der Rückbauaktivitäten der 8 Gas-Turbinen-Generatoren Einheiten und der Schallschutzwand.

Mai 26	Jun / Juli 26	Juni / Juli 26	Aug. 26	Sep. 26	Okt. 26	Nov. 26	Dez. 26
Außerbetriebnahme	Demontage der Module und Kamine	Abtransport der GTG-Module	Demontage der Schallschutzwandelemente	Rückbau Stahlstruktur	Rückbau Fundamente	Parkplatzbau	Begrünung
Abgeschlossen	Kamine der 8 Einheiten sind demontiert	GTG-Module Abgeschlossen	Im Gange				

Zone 3 Stand des Rückbaus

Planung der Rückbauaktivitäten der 4 Transformatoren

Mai 26	Juni 26	Jul. 26	Aug. 26	Sep. 26	Okt. 26	Nov. 26	Dez. 26
Außerbetriebnahme	Demontage der Kabeltrassen	Demontage / Abtransport der Transformatoren	Rückbau des Swissgrid Unterwerks Lupfig	Rückbau der Betonwände	Rückbau Fundamente	Aufschütten Nivellieren	Begrünung
Abgeschlossen	Abgeschlossen	Transportvorbereitungen im Gange	Im Gange				

Zone 4 Stand des Rückbaus

Planung der Rückbauaktivitäten der Flüssig-Brennstoff-Reservoirs und der Ölförderanlagen

Mai 26	Juni 26	Juni / Juli 26	Aug. 26 / Sep. 26	Okt. 26	Nov. 26	Dez. 26
Außerbetriebnahme	Demontage der Module	Abtransport der Module	Demontage der Brennstofftanks	Rückbau Fundamente	Aufschütten Nivellieren	Begrünung
Abgeschlossen	Abgeschlossen	Abgeschlossen	Im Gange			
